

神山中学校建設工事の進捗状況について (令和4年1月14日)

現在、新校舎建設工事は内部・外部仕上工事と外構工事を行っています。

内部に関しては、1階が天井・壁が仕上り、部屋内の床も一部仕上がっています。2階は壁の塗装工事、設備機器取付けが行われ、3階は天井ボード張り、家具工事、設備工事が行われています。2月上旬には内部も大部分が仕上る予定です。

外部に関しては、12月中旬より順次、外部足場の解体が行われ、各面の建物外観が現れています。外構工事は校舎棟廻り、グランド側と全体的に工事が進んでいます。


工事は令和4年3月完成に向け、予定通り順調に進んでいます。



(神領小学校より撮影)



(中津側より撮影)

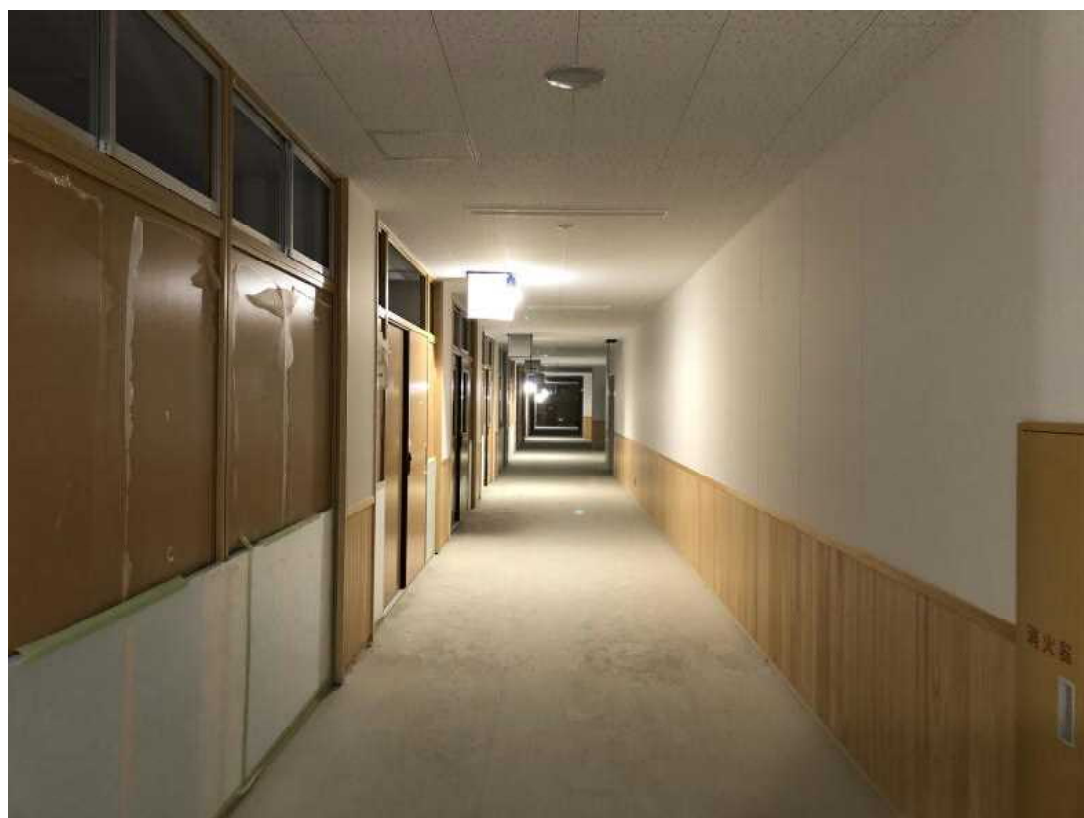

(1階廊下の状況)



(2階廊下の状況)



(3階廊下の状況)
